ACTIVIDAD PRÁCTICA · DISEÑO DEL DASHBOARD · PÁGINA 8

El estado real de AlquilER, en una sola pantalla.

Tablero de control del proyecto **AlquilER** (alquiler de propiedades) al **25/10/2026**. Reúne 74 días de trabajo, **762 commits** del período, **31 PRs integrados** y **2.127 pruebas automatizadas** para responder una sola pregunta: *¿estamos listos para entregar y qué conviene hacer en el próximo sprint?*

- Release candidate
- 4 de 5 KPI en meta
- Web + API + Mobile desplegados
- 1 brecha: CI/CD y E2E

74 días	762	31	2.127	97,83 %
PERÍODO ANALIZADO	COMMITS DEL PERÍODO	PRS MERGEADOS	PRUEBAS AUTOMATIZADAS	COBERTURA BACKEND

Inicio: 11/08/2026 **Último commit:** 23/10/2026 · 11:43 ART **Corte de datos:** 25/10/2026 · 20:05 ART

Equipo: Julián Pretz · Mariano Fernández

Lectura en 30 segundos

El alcance funcional del MVP está completo y la calidad del backend es alta. El proyecto **puede defenderse hoy**, pero todavía no está listo para producción: falta automatizar la integración, ampliar las pruebas end-to-end y agregar monitoreo. La recomendación es **congelar features** y dedicar el próximo sprint a cerrar esas tres brechas.

- **Producto:** 14/14 módulos documentados y 5/5 historias núcleo operativas.
- **Calidad backend:** 97,83% de cobertura de líneas, 2.123 tests unitarios y 0 issues abiertos.
- **Brecha principal:** 50% de los flujos críticos tienen E2E y no hay pipeline de CI/CD.

Veredicto

ESTADO GENERAL

Verde con observaciones

Listo para la defensa y para un release candidate. No listo para producción sin CI/CD, E2E y monitoreo.

4/5	0	2,9	50%
KPI en meta	issues abiertos	PRs/semana	E2E

- ✓ 5 KPIs relevantes
- ✓ Estado actual del proyecto
- ✓ Barras, anillos y semáforos
- ✓ Artefacto explicativo
- ✓ Link en servidor gratuito

01 · INDICADORES

Cinco KPIs para decidir, no para decorar

Cada indicador tiene fórmula, meta, fuente y una decisión asociada. Se combinaron métricas de resultado (alcance y defectos) con métricas anticipatorias (cobertura, velocidad y E2E) para no mirar solo el pasado.

Corte: 25/10/2026 · 20:05 ART

KPI-01 · ALCANCE — En meta

Avance del alcance MVP

100%

14/14 módulos documentados · 5/5 historias núcleo

0% Meta ≥ 90% 100%

Decisión: cerrar el alcance y etiquetar el release candidate; no sumar módulos nuevos.

Fuente: README + rutas API Frecuencia: semanal

KPI-02 · CALIDAD — En meta

Cobertura de pruebas backend

97,83%



9.714/9.929 líneas · 843/854 métodos · 2.123 tests unitarios

0% Meta ≥ 85% 100%


Decisión: mantener la meta como puerta de release; el backend no requiere más tests unitarios.

Fuente: PHPUnit 11.5 + Xdebug Frecuencia: por rele

KPI-03 · FLUJO — En meta

Velocidad de integración

2,9 PR/sem



31 PRs mergeados en 10,6 semanas · 0 PRs abiertos

0 Meta ≥ 2,0/sem 4

Decisión: sostener el ritmo, pero priorizar PRs pequeños y revisados antes de las 20:00.

Fuente: GitHub API (PRs) Frecuencia: semanal

KPI-04 · DEFECTOS — En meta

Defectos abiertos

0

3/3 cerrados
promedio 2,6 días

Issues de GitHub al corte · muestra pequeña (3 reportados)

Meta ≤ 2 abiertos 0 actuales

Decisión: pasar de "apagar incendios" a prevención: CI, E2E y monitoreo.

Fuente: GitHub Issues Frecuencia: semanal

KPI-05 · E2E — Atención

Cobertura E2E del frontend

50%



4 flujos con Playwright de 8 flujos críticos definidos · 10 pruebas

0 Meta ≥ 80% 100%

Decisión: sumar E2E de login, publicación, reserva, reseña, mensajería y favoritos antes del 15/11.

Fuente: Playwright (4 specs) Frecuencia: por release

Frontend web
React 19 + Vite 5 · alwaysdata
200 OK

API REST
PHP 8.2 · MariaDB · 113 rutas
200 OK

Base de datos
17 tablas + 1 vista · integridad testeada
OK

Chequeo manual del 25/10/2026 a las 19:58 ART. Latencia mediana de la API: **≈ 500 ms** (5 muestras; 1.018 ms en la primera llamada en frío). No hay monitoreo continuo todavía: ver riesgo R-04.

02 · EVOLUCIÓN


Cómo se movió el proyecto, semana a semana

Los commits no miden esfuerzo por sí solos, pero muestran ritmo, concentración de trabajo y momentos de integración. El período se divide en 4 sprints y 11 semanas ISO.

762 commits · 3 repositorios

Commits por semana y repositorio

Barras apiladas · semana ISO · 11/08/2026 al 23/10/2026

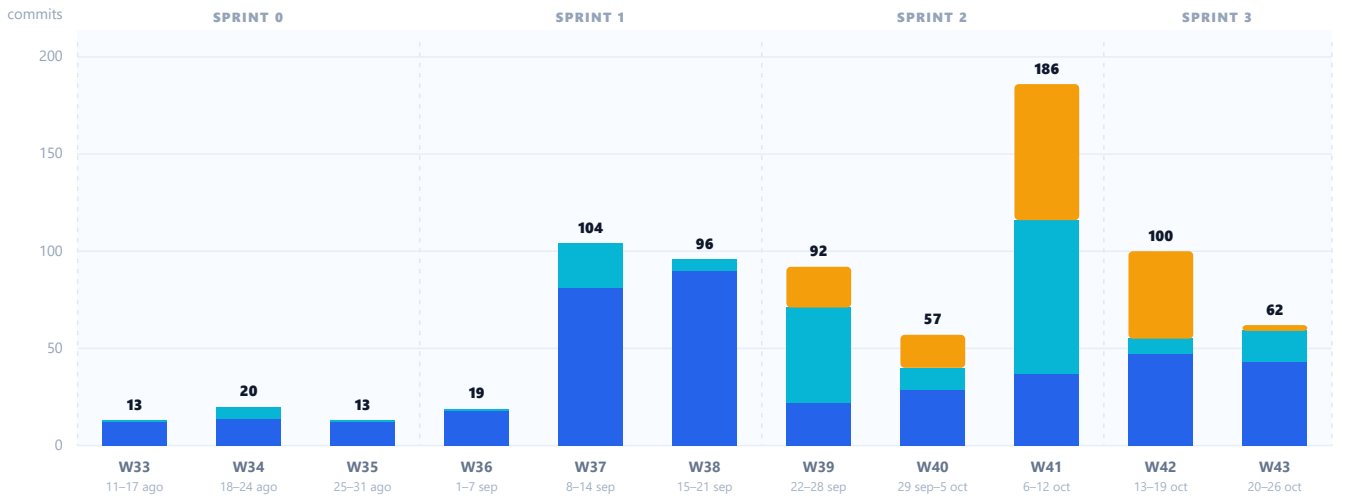

Curva acumulada de commits

10,6 semanas

Los 762 commits del período · hitos de sprint



Lo que dicen los datos

Dos picos, dos causas.
W37–W38 (171 commits backend) coinciden con el refactor por capas y seguridad. W41 (186 en total) con la integración web + mobile.

El cierre fue intenso.
W43 concentra 62 commits en 5 días: verificación de email, rate limiting y hardening de logs.

Ritmo sostenido.
Promedio de 69 commits/semana y 2,9 PRs/semana; el equipo no dependió de una sola semana heroica.

03 · PLANIFICACIÓN

74 días, 4 sprints y un solo objetivo: el MVP

El proyecto arrancó el 11/08/2026 con el contrato de API y cerró el 23/10/2026 con el hardening de seguridad. La tabla permite ver qué se hizo en cada tramo y cuánto pesó cada repositorio.

31 PRs · 4 releases internos

Sprints del período AlquilER. Los commits incluyen merges y commits automáticos; se usan como señal de actividad, no como medida de esfuerzo.

SPRINT	FECHAS	OBJETIVO	COMMITS	PRS	RESULTADO	ESTADO
S0 Inicio	11/08 → 30/08 20 días	Contrato de API, repositorio, arquitectura base y rama dev.	46	0	API-CONTRACT cerrado; backend y frontend web inicializados.	Completado
S1 Núcleo	31/08 → 20/09 21 días	Refactor por capas (Controller → Service → Repository), JWT, seguridad y base de datos.	219	21	14 módulos del backend, rate limit, tests de integridad y create_database.sql.	Completado
S2 Producto	21/09 → 11/10 21 días	App móvil, reservas, reseñas, notificaciones, mensajería y precalificación.	335	6	Web y mobile integrados; flujo completo de alquiler y reputación.	Completado
S3 Calidad	12/10 → 23/10 12 días	Cobertura, rate limiting, verificación de email, imágenes y hardening de despliegue.	162	4	97,83% de cobertura, deploy en alwaysdata y último commit de seguridad.	Con observaciones
Total	**11/08 → 23/10**	**MVP completo + release candidate**	**762**	**31**	**3 repositorios · 74 días**	RC

Distribución de commits

405 backend **201** web

156 mobile

Código del proyecto

86,8k líneas (sin SQL)

452 archivos

Relación tests / código backend

1,72× 31.529 / 18.323 líneas

04 · EQUIPO

Dos personas, tres productos y un patrón de trabajo

La carga está repartida casi en partes iguales, pero el conocimiento crítico sigue concentrado en dos personas. El horario de commits también deja una señal: casi la mitad del trabajo se hizo después de las 20:00.

762 commits · 2 integrantes

Participación por autor

Commits del período · 11/08 al 23/10



Julián Pretz **50,5%**

@JulianMP1997 · web, testing y seguridad

Mariano Fernández **49,5%**


@marnafer · backend, mobile y deploy

385 y 377 commits respectivamente. Los alias de Git se normalizaron por persona.

Franja horaria de commits

44,7% después de 20:00

Backend · 405 commits · hora local ART



Pico: 14:00 · 66 commits

Noche: 20:00–01:00 · 181 commits

Madrugada: 01:00 · 30 commits

45%
del backend se commiteó después de las 20:00

14:00
franja más productiva, seguida por 22:00

11 sem.
de ritmo sostenido sin semanas vacías

05 · TRAZABILIDAD

Los commits que explican la historia

Fechas y horas exactas en horario de Argentina (ART, UTC−3). La muestra prioriza decisiones de arquitectura, seguridad, calidad y despliegue; el historial completo está en los tres repositorios de GitHub.

Último commit: 23/10/2026 · 11:43 ART

11 AGO 2026 · 22:57
Kickoff del backend
Estado inicial del proyecto base. `0951860` backend

15 AGO 2026 · 20:52
Contrato de API cerrado
Finalización y resumen de API-CONTRACT. `d5bcd30`

31 AGO 2026 · 15:04
Primera integración a dev
Merge del PR #2; arranca el trabajo por ramas. `a6dc045`

07 SEP 2026 · 15:05
Hardening de seguridad
Validación de entorno y JWT; errores ocultos en producción. `e6d7e56`

11 SEP 2026 · 15:05
Base de datos reproducible
`create_database.sql` + test de integridad de las 17 tablas. `6b0bd45`

23 SEP 2026 · 14:09
Nace la app móvil
Inicialización de React Native + Expo Router. `ee0a51c` mobile

10 OCT 2026 · 19:31
Precalificación de interesados
Perfil y requisitos configurables para consultas. `5d5314b`

17 OCT 2026 · 19:14
Arranca la carrera de cobertura
Xdebug + PHPUnit source; Validators al 100%. `988fcdf`

19 OCT 2026 · 13:55
APK y rate limiting
Configuración EAS para APK y límites por ruta/método. `420bf77` · `2dd7910`

22 OCT 2026 · 15:01
Verificación de email + imágenes
Registro verificado, bloqueo de login y procesamiento de imágenes. `7b4bca5`

23 OCT 2026 · 11:43
Último commit del período
Bloqueo de acceso directo a logs y archivos sensibles. `e3f3643`

25 OCT 2026 · 20:05
Corte del tablero
Se congelan las métricas para la entrega y la exposición.

Muestra de 22 commits clave. El filtro no afecta la versión impresa: el PDF incluye todos. Los hashes enlazan al commit original; los mensajes se muestran tal como están en Git, sin corregir ortografía.

FECHA Y HORA	REPO	HASH	AUTOR	MENSAJE
11/08/2026 22:57	backend	0951860	Mariano	chore: estado inicial del proyecto base
15/08/2026 20:52	backend	d5bcd30	Mariano	Finalización y resumen de API-CONTRACT
16/08/2026 14:00	web	fddb199	Julián	Home completo de Web
31/08/2026 15:04	backend	a6dc045	Mariano	Merge pull request #2 · primera integración a dev
01/09/2026 15:10	backend	9ffd401	Mariano	Merge PR #5 · separación en capas de Propiedad
07/09/2026 15:05	backend	e6d7e56	Mariano	Merge PR #11 · validar configuración de entorno y JWT
11/09/2026 15:05	backend	6b0bd45	Mariano	Merge PR #19 · create_database + test de integridad
23/09/2026 14:09	mobile	ee0a51c	Mariano	Inicialización del proyecto React Native
28/09/2026 15:03	backend	1f74a88	Mariano	Merge PR #23 · integración de la semana
10/10/2026 19:31	backend	5d5314b	Mariano	feat: perfil de precalificación de interesados en consultas
13/10/2026 15:01	backend	72e8ab3	Mariano	fix: solo el inquilino puede cancelar una reserva pendiente
15/10/2026 14:13	backend	45d34be	Mariano	Notificaciones al crear reseñas
17/10/2026 19:14	backend	988fcdf	Julián	test: Xdebug + coverage source; Validators al 100%
19/10/2026 13:55	mobile	420bf77	Mariano	feat: configuración para desplegar APK
19/10/2026 14:47	backend	2dd7910	Mariano	Merge PR #34 · rate limiter y límites por endpoint
20/10/2026 22:04	backend	f9d30bc	Julián	Flujo completo de “olvidé mi contraseña” con correo
21/10/2026 21:52	backend	2bf934e	Julián	test: BootstrapTest, OpenApiSpecTest y relaciones de modelos
22/10/2026 14:57	backend	147016c	Mariano	feat: validar y procesar imágenes de propiedades
22/10/2026 15:01	backend	7b4bca5	Julián	feat: verificación de email en registro y bloqueo de login
22/10/2026 15:01	web	47760a4	Julián	feat: pantalla de verificación de email
23/10/2026 11:32	backend	6be07bf	Julián	Configuración por entorno mejorada
23/10/2026 11:43	backend	e3f3643	Julián	Bloquea acceso directo a logs y archivos sensibles

06 · RIESGOS

Lo que puede fallar después de la entrega

Un tablero que solo muestra verde no sirve para decidir. Estos son los riesgos que el equipo identificó al corte, con impacto, mitigación, responsable y fecha objetivo.

5 riesgos · 1 alto

R-01 · Sin pipeline de CI/CD

Alto / Medio

Los tests y el build se ejecutan a mano; el deploy a alwaysdata también. Un merge roto puede llegar a producción sin aviso.

Mitigación: GitHub Actions con `composer test:unit` + `npm run build`, y bloquear merges si falla. **Responsable:** Mariano · **Fecha:** 08/11/2026.

R-02 · Cobertura E2E al 50%

Medio / Alto

Login, publicación, reserva, reseña, mensajería y favoritos no tienen prueba end-to-end. Son los flujos con más riesgo de regresión.

Mitigación: 6 specs Playwright nuevos y smoke test en cada release. **Responsable:** Julián · **Fecha:** 15/11/2026.

R-03 · Bus factor = 2

Medio / Alto

Todo el conocimiento está en dos personas. Una ausencia prolongada frena el mantenimiento y el deploy.

Mitigación: ADRs, README de deploy y sesión de handoff cruzado. **Responsable:** Ambos · **Fecha:** 30/11/2026.

R-04 · Monitoreo y backups manuales

Medio / Medio

El chequeo de salud es puntual y el hosting gratuito no garantiza backups. No hay alertas si la API se cae.

Mitigación: UptimeRobot + backup MySQL semanal + alerta a Discord/email. **Responsable:** Mariano · **Fecha:** 15/11/2026.

R-05 · Pocas pruebas de integración

Bajo / Medio

Solo 4 tests de integración; requieren MySQL y HTTP local. La suite unitaria no detecta problemas de contrato entre capas.

Mitigación: CI con servicio MySQL y al menos 10 tests de integración. **Responsable:** Julián · **Fecha:** 22/11/2026.

R-06 · Métricas sin automatizar

Bajo / Bajo

Este tablero se armó con un corte manual. Si no se automatiza, queda desactualizado en una semana.

Mitigación: script semanal que exporte Git + GitHub API + PHPUnit a JSON. **Responsable:** Julián · **Fecha:** 22/11/2026.

D-01 · Congelar alcance

Etiquetar `v1.0.0-rc1` y no sumar módulos hasta cerrar CI y E2E.

Hoy · Mariano

D-02 · Priorizar calidad

El próximo sprint es 60% CI/E2E/monitoreo y 40% correcciones; cero features nuevas.

Semana del 26/10 · Ambos

D-03 · Publicar evidencia

Subir este tablero + PDF y usar el link de alwaysdata en la entrega.

25/10 · Julián

07 · MÉTODO

Cómo se calcularon los números

Todo dato de este tablero es verificable. Las métricas se obtuvieron de Git, GitHub, PHPUnit, Playwright y chequeos HTTP, con un corte único para evitar mezclar ventanas de tiempo.

Corte único: 25/10/2026 · 20:05 ART

Definición operativa de cada KPI. Los umbrales se acordaron antes de medir para evitar sesgo.

KPI	FÓRMULA	VALOR	META	FUENTE	TIPO
Avance MVP	Módulos entregados / planificados × 100	14/14 = 100%	≥ 90%	README + `api.php`	Resultado
Cobertura backend	Líneas cubiertas / líneas ejecutables × 100	9.714/9.929 = 97,83%	≥ 85%	PHPUnit + Xdebug	Anticipatorio
Velocidad	PRs mergeados / semanas del período	31/10,57 = 2,93	≥ 2,0 /sem	GitHub API	Anticipatorio
Defectos abiertos	Issues abiertos al corte	0	≤ 2	GitHub Issues	Resultado
Cobertura E2E	Flujos críticos con suite / flujos definidos × 100	4/8 = 50%	≥ 80%	Playwright (4 specs)	Anticipatorio

Fuentes y comandos de reproducción

Los tres repositorios se analizaron con Git; GitHub aportó PRs e issues; PHPUnit/Xdebug, la cobertura.

```
# Conteo y período
git -C AlquilER rev-list --all --count
git -C AlquilER log --since=2026-08-11 --date=iso \
  --pretty=format:'%h|%ad|%an|%s'

# Cobertura (unit suite)
php vendor/bin/phpunit --testsuite Unit --coverage-text

# PRs e issues
GET https://api.github.com/repos/marnafer/AlquilER-backend/issues

# Salud del servicio
GET https://alquiler.alwaysdata.net/api/health
```

- **Período:** 11/08/2026 00:00 a 23/10/2026 11:43 ART (último commit).
- **Commits:** 405 backend + 201 web + 156 mobile = 762. No incluye los 186 commits previos del repo web (abril–junio 2026).
- **Semáforo:** verde cumple meta; ámbar entre 80% y 99% de la meta o evidencia parcial; rojo por debajo del 80% o servicio caído.

Ficha técnica del corte

Repositorios

AlquilER-backend · AlquilER-frontend-web · AlquilER-frontend-mobile

Stack

PHP 8.2 + MariaDB 10.4 + Eloquent · React 19 + Vite 5 · React Native + Expo 57

Backend

173 archivos fuente, 18.323 líneas · 126 archivos de test, 31.529 líneas

Base de datos

17 tablas + 1 vista · 722 líneas de SQL

API

113 rutas + health check · JWT · rate limiting

Tests

2.127 (2.123 unitarios + 4 de integración) · 6.539 aserciones · 13 skipped

Deploy

alwaysdata (web + API) · APK vía EAS internal distribution

Límites de interpretación

- Los commits incluyen merges y 42 commits automáticos de agentes en el frontend (~5,5%).
- La cobertura es de la suite unitaria; no incluye los 4 tests de integración.
- La latencia son 5 muestras manuales, no un SLA ni uptime.
- Los issues son solo los de GitHub; no registran bugs detectados por chat.

08 · ENTREGA

Link de funcionamiento y publicación del artefacto

La aplicación ya está desplegada en un servidor gratuito. Este tablero es un archivo estático: se puede publicar en GitHub Pages o Netlify Drop sin backend.

alwaysdata · GitHub Pages · Netlify

APLICACIÓN WEB · PRODUCCIÓN
alquilerr.alwaysdata.net
Frontend React desplegado

API · HEALTH CHECK
alquiler.alwaysdata.net/api/health
Respuesta 200 OK verificada

REPOSITORIO BACKEND
github.com/marnafer/AlquilER-backend
405 commits · 31 PRs

REPOSITORIO WEB
github.com/marnafer/AlquilER-frontend-web
React 19 + Vite 5

REPOSITORIO MOBILE
github.com/marnafer/AlquilER-frontend-mobile
React Native + Expo

ESTE TABLERO · PDF
AlquilER-Dashboard.pdf
Versión imprimible A4

PDF Para exportar de nuevo: **Ctrl+P** (o Cmd+P) → "Guardar como PDF" → A4, márgenes predeterminados y "Gráficos de fondo" activado. El diseño ya está preparado para impresión.

Publicar este index.html gratis

1. **GitHub Pages:** crear un repo público `AlquilER-dashboard`, subir `index.html` y el PDF, ir a **Settings** → **Pages** y elegir **Deploy from a branch** → **main / root**. La URL queda como `https://TU-USUARIO.github.io/AlquilER-dashboard/`.
2. **Netlify Drop:** entrar a `app.netlify.com/drop` y arrastrar la carpeta. Devuelve una URL pública al instante, sin tarjeta.
3. **Alwaysdata:** subir la carpeta por FTP/SSH a `www/` y abrir `https://TU-CUENTA.alwaysdata.net/AlquilER-dashboard/`.
4. **Entrega:** pegar en el PDF la URL del tablero y la URL de la app. Ambas deben abrir sin login para el docente.

Estado actual: la app y la API están online. El tablero se publica como archivo estático y no depende del backend.

AlquilER · Dashboard de proyecto
Julián Pretz & Mariano Fernández · 25/10/2026

Actividad Práctica "Diseño del Dashboard" · Gestión de Desarrollo de Software
Datos: Git · GitHub API · PHPUnit/Xdebug · Playwright · health checks

Volver arriba ↑
